

REGIONE BASILICATA


COMUNE DI POTENZA

ARCHIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO



Chiesa di San Michele Arcangelo

Intervento di: Restauro e valorizzazione



Sviluppo Urbano Città di Potenza

Finanziamento: POR FERS Basilicata 2014-2020 - Asse V

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA 8.02	ELABORATI PROGRAMMA PER LA SICUREZZA Diagramma di Gantt	SCALA — : — DATA 12 Dic. 2019
---------------------------	--	--

PROGETTO e DIREZIONE LAVORI: Ing. Pasquale LANZI _____

COORDINATORE SICUREZZA: Ing. Pasquale LANZI _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Vincenzo NOLE' _____

ALLEGATO "A"

Comune di Potenza
Provincia di PZ

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Intervento di recupero di restauro e valorizzazione della Chiesa di San Michele Arcangelo. Programma Urbano città di Potenza POR FERS Basilicata 2014-2020 Asse V

COMMITTENTE: ARCHIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO.

CANTIERE: Piazza S. Michele, Potenza (PZ)

Potenza, 12/12/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere Lanzi Pasquale)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Geom. Responsabile del Procedimento Nolè Vincenzo)

Ingegnere Lanzi Pasquale

Piazzale A. Moro
85100 Potenza (PZ)
Tel.: 0971 23529 - Fax: 0971 23529
E-Mail: pasqualelanzi@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Finale
Allestimento del cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	10/06/2020
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	5	15/06/2020
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	16/06/2020
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	16/06/2020
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	19/06/2020
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	3	3	24/06/2020
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	3	3	24/06/2020
Ponteggio					
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	E	18	26	20/07/2020
	2	E	11	18	28/12/2020
Capo A – Lavori edili:					
Rimozione di manto di copertura in tegole	3	E	5	7	27/07/2020
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	3	E	2	2	29/07/2020
Rimozione di manto impermeabile	3	E	5	7	05/08/2020
Rimozione di massetto	3	E	5	7	12/08/2020
Formazione di massetto per coperture	3	E	11	15	27/08/2020
Impermeabilizzazione di coperture	3	E	11	15	11/09/2020
Realizzazione di opere di lattoneria	3	E	5	5	18/09/2020
Posa di manto di copertura in tegole	3	E	15	19	09/10/2020
Montaggio di porte per esterni	3	E	3	3	30/12/2020
Montaggio di porte interne	3	E	2	2	08/01/2021
Montaggio di serramenti interni	3	E	3	6	28/12/2020
Esecuzione di tracce eseguite a mano	3	E	5	7	15/12/2020
Realizzazione di impianto elettrico	3	E	3	5	21/12/2020
Capo B – Restauro delle opere artistiche:					
Opere Artistiche	4	E	1	1	11/01/2021
Capo C –Allestimenti:					
Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso e espositori opere artistiche	5	E	15	19	29/01/2021
Tinteggiatura di superfici interne	5	E	15	19	12/03/2021
Realizzazione di impianto elettrico	5	E	15	19	19/02/2021
Capo D - Impianti:					
Realizzazione di impianto antifurto	6	E	5	7	16/11/2020
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	6	E	5	5	20/11/2020
Realizzazione di impianto video controllo	6	E	5	5	27/11/2020
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico	6	E	14	20	09/11/2020
Realizzazione di tramezzature interne	6	E	3	3	14/10/2020
Montaggio di porte tagliafuoco	6	E	1	1	30/11/2020
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni	6	E	5	5	04/12/2020
Ripresa di intonaci interni	6	E	2	4	07/12/2020

Tabella Analitica Gantt

Lavori in economia					
Esecuzione di opere murarie in genere a mano	7	E	7	9	03/11/2020
	7	E	10	12	26/03/2021
Esecuzione di opere murarie in genere con attrezzi meccanici	7	E	7	9	03/11/2020
	7	E	10	12	26/03/2021

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = Nuova Zona...
- 3) = Nuova Zona...
- 4) = Nuova Zona...
- 5) = Nuova Zona...
- 6) = Nuova Zona...
- 7) = Nuova Zona...

I = IMPRESA


Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>


gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro


Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settim:
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Realizzazione di tramezzature interne	3 g																															
Montaggio di porte tagliafuoco	1 g																															
Rimozione dello strato di finitura di intonaci interni	5 g																															
Ripresa di intonaci interni	2 g																															
Lavori in economia	106 g																															
Esecuzione di opere murarie in genere a mano	17 g																															
Esecuzione di opere murarie in genere con attrezzi meccanic	17 g																															
LEGENDA Zona:																																
Z1 = ZONA UNICA																																
Z2 = Nuova Zona...																																
Z3 = Nuova Zona...																																
Z4 = Nuova Zona...																																
Z5 = Nuova Zona...																																
Z6 = Nuova Zona...																																
Z7 = Nuova Zona...																																

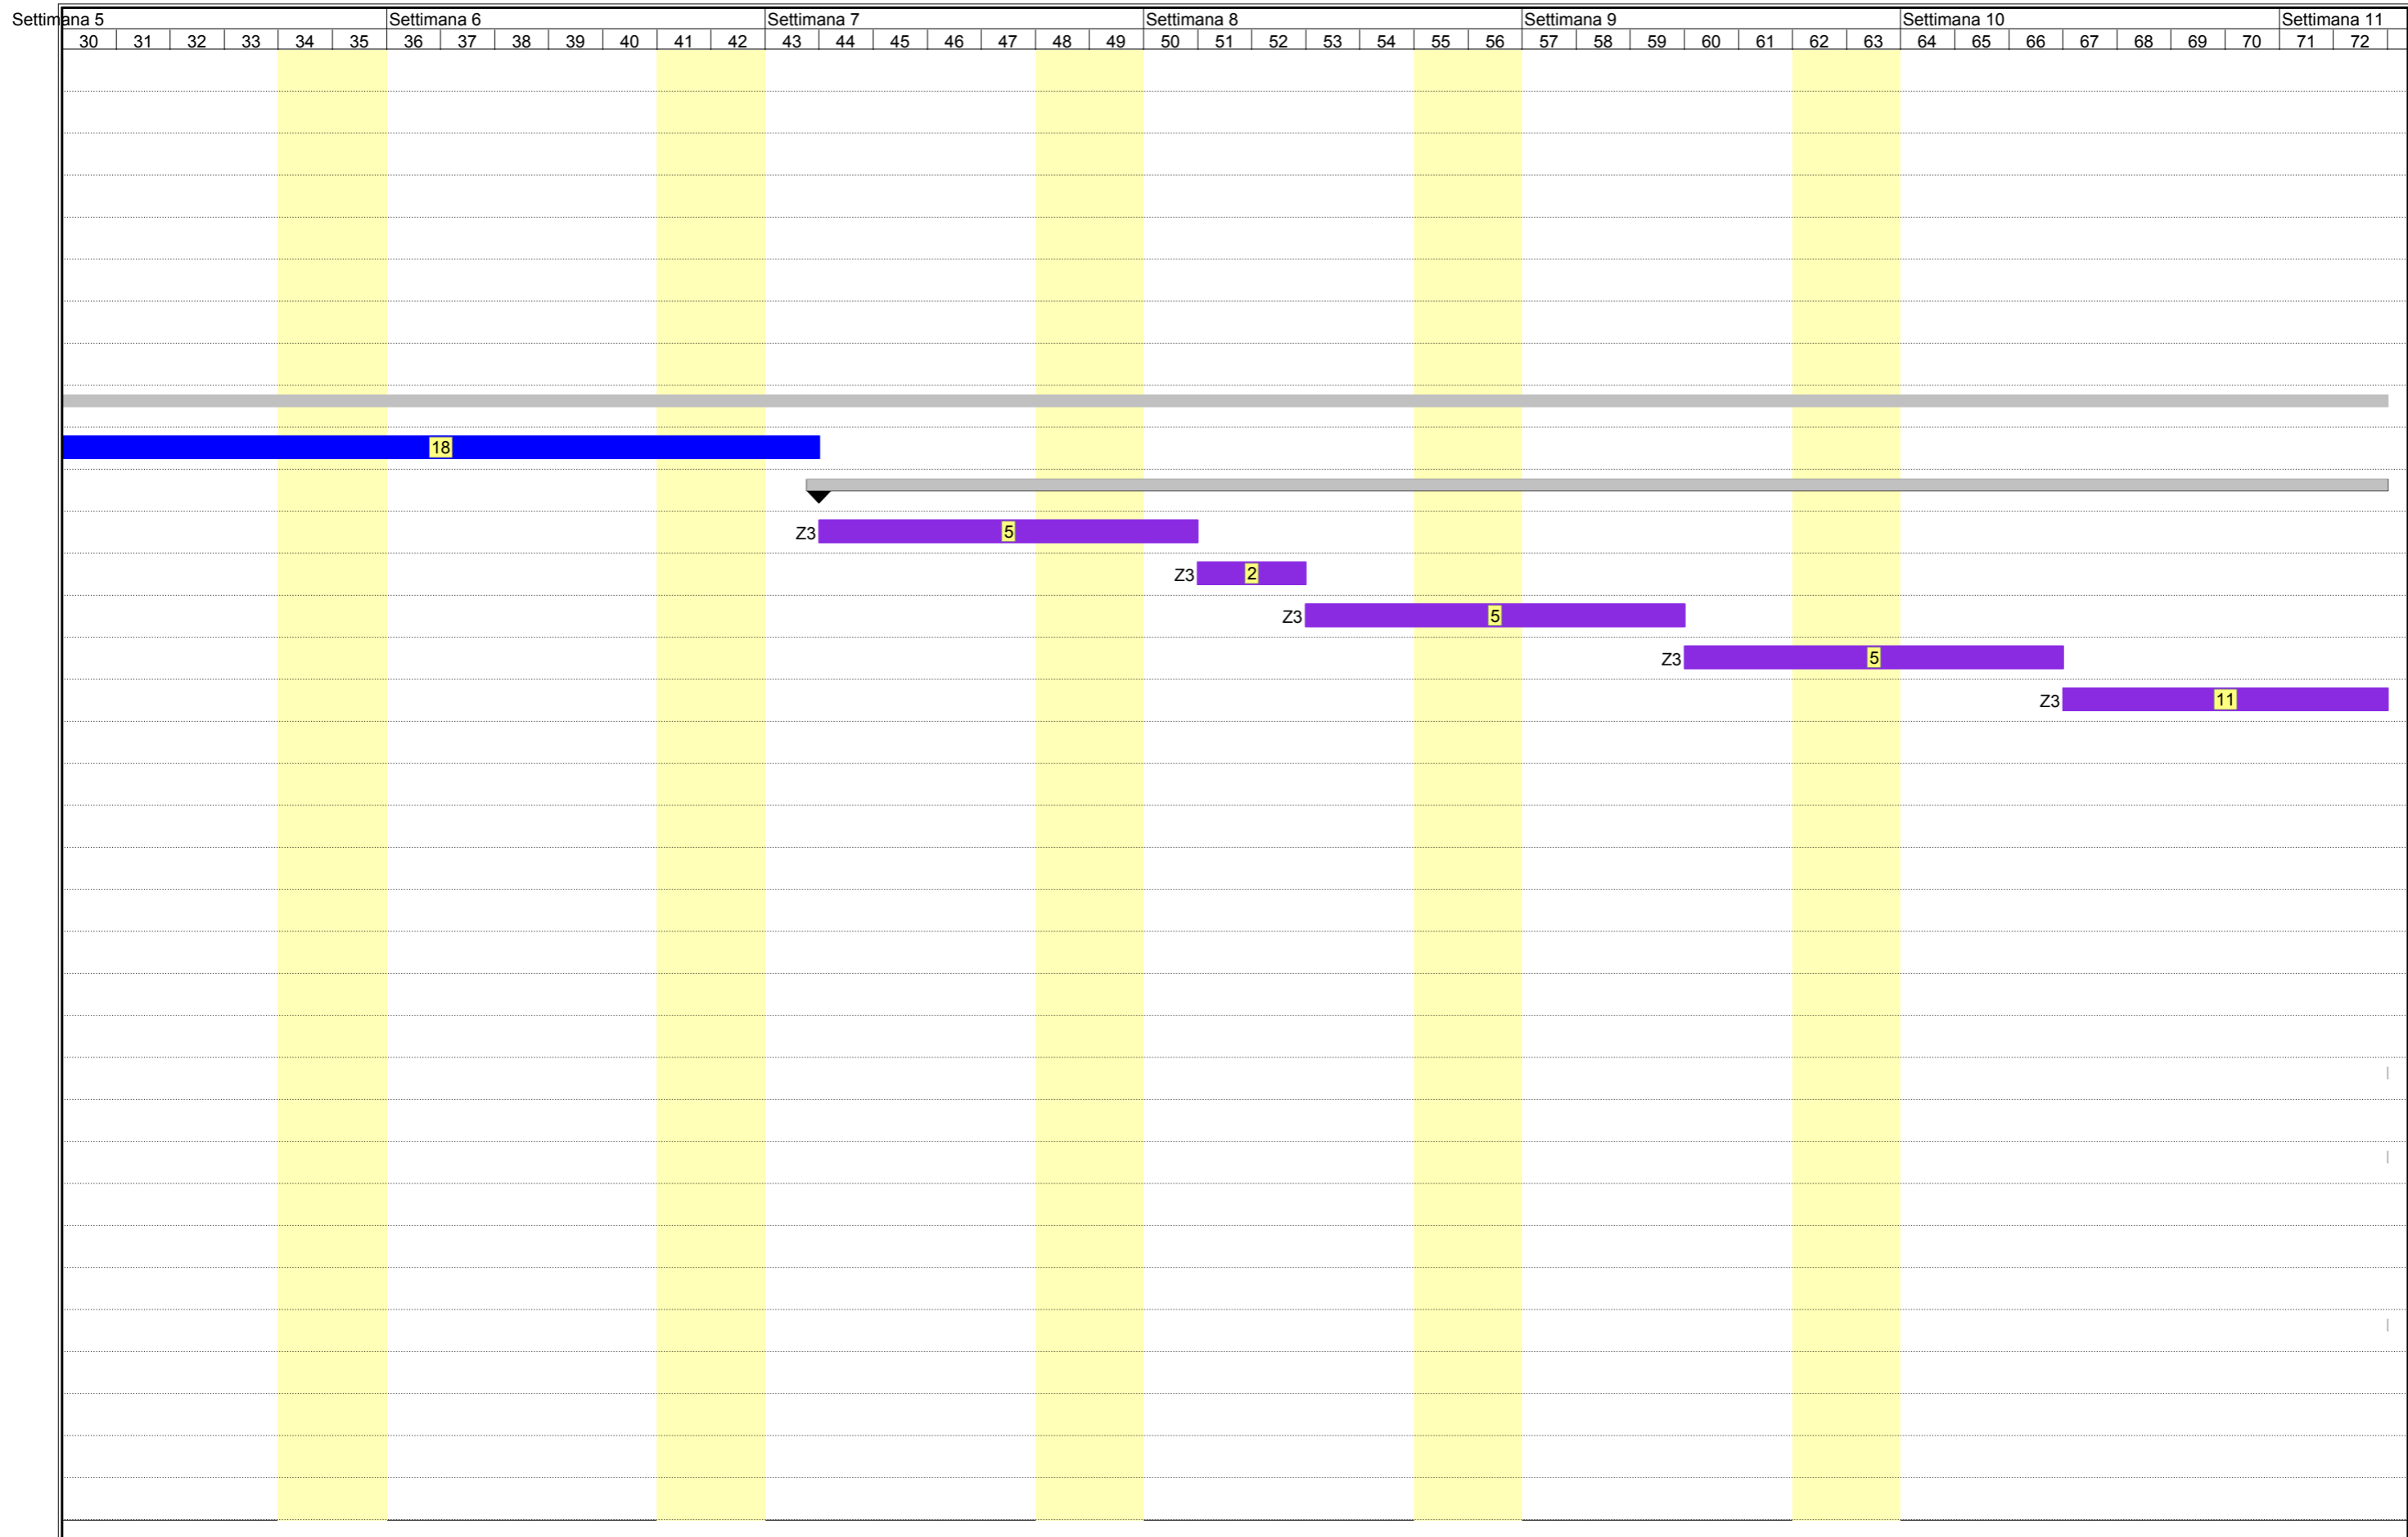


Settimana	Settimana 5					Settimana 6					Settimana 7					Settimana 8					Settimana 9					Settimana 10					Settimana 11	
	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	43	44	45	46	47	50	51	52	53	54	57	58	59	60	61	64	65	66	67	68	71	72

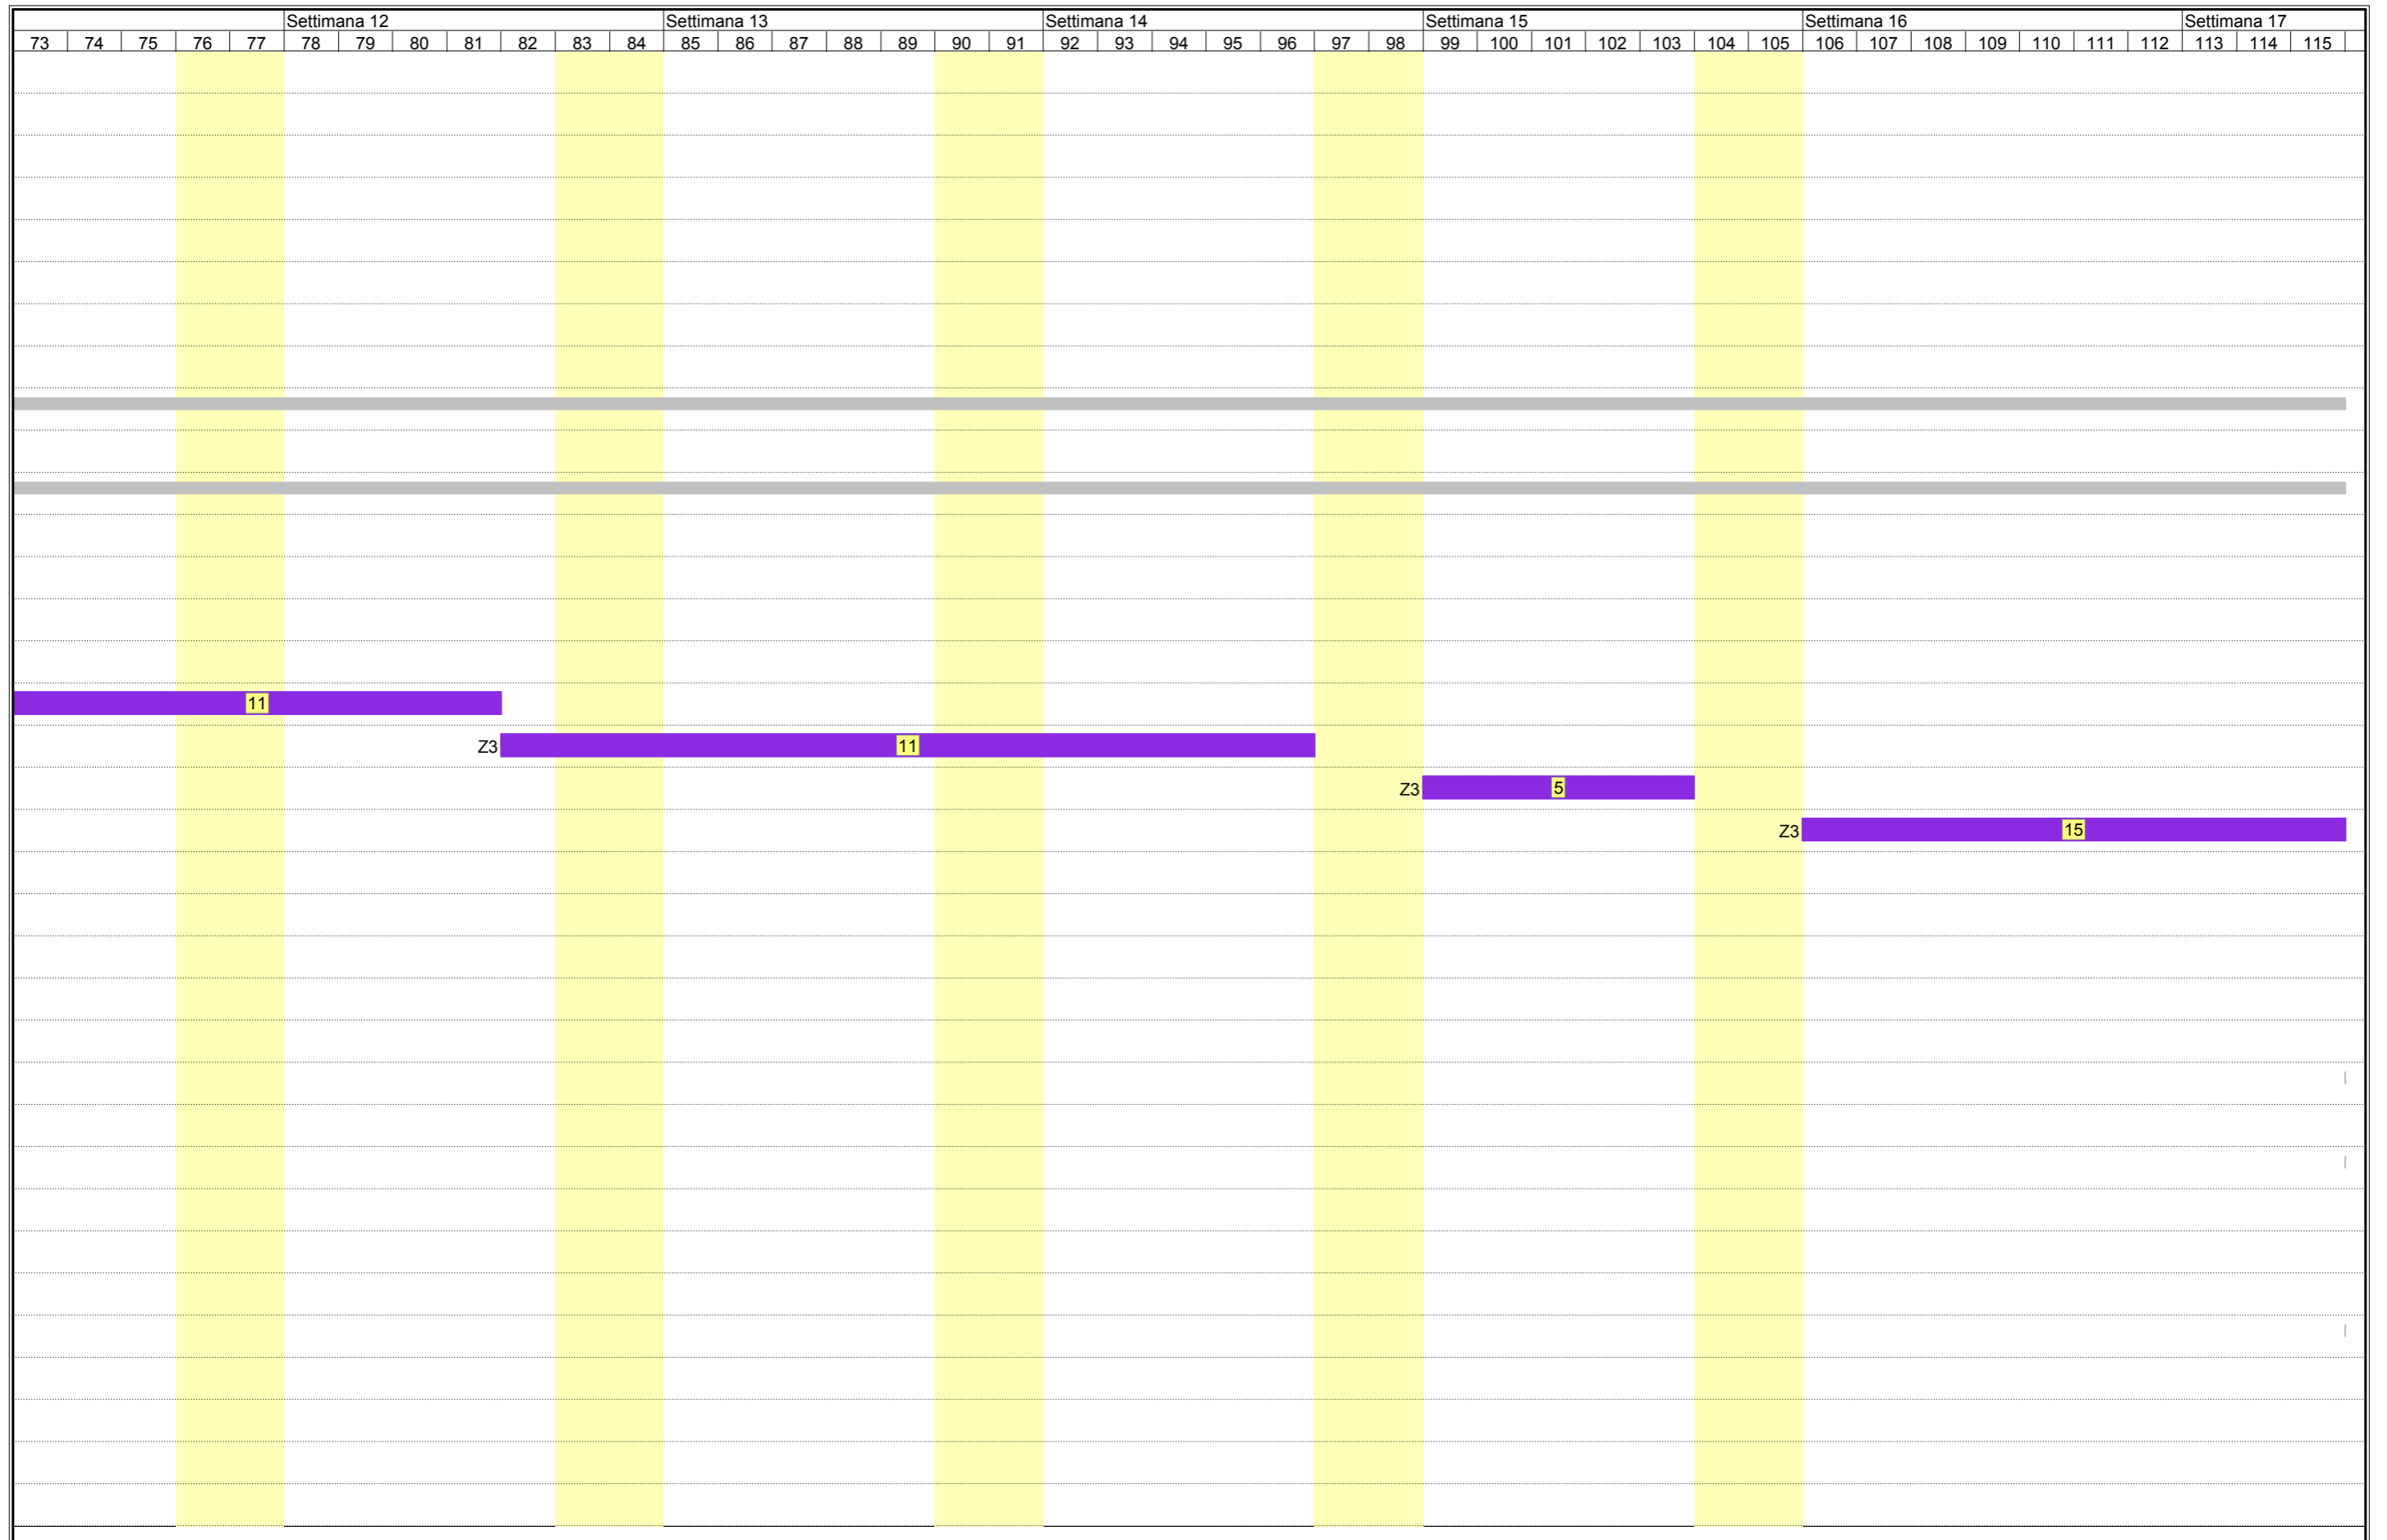


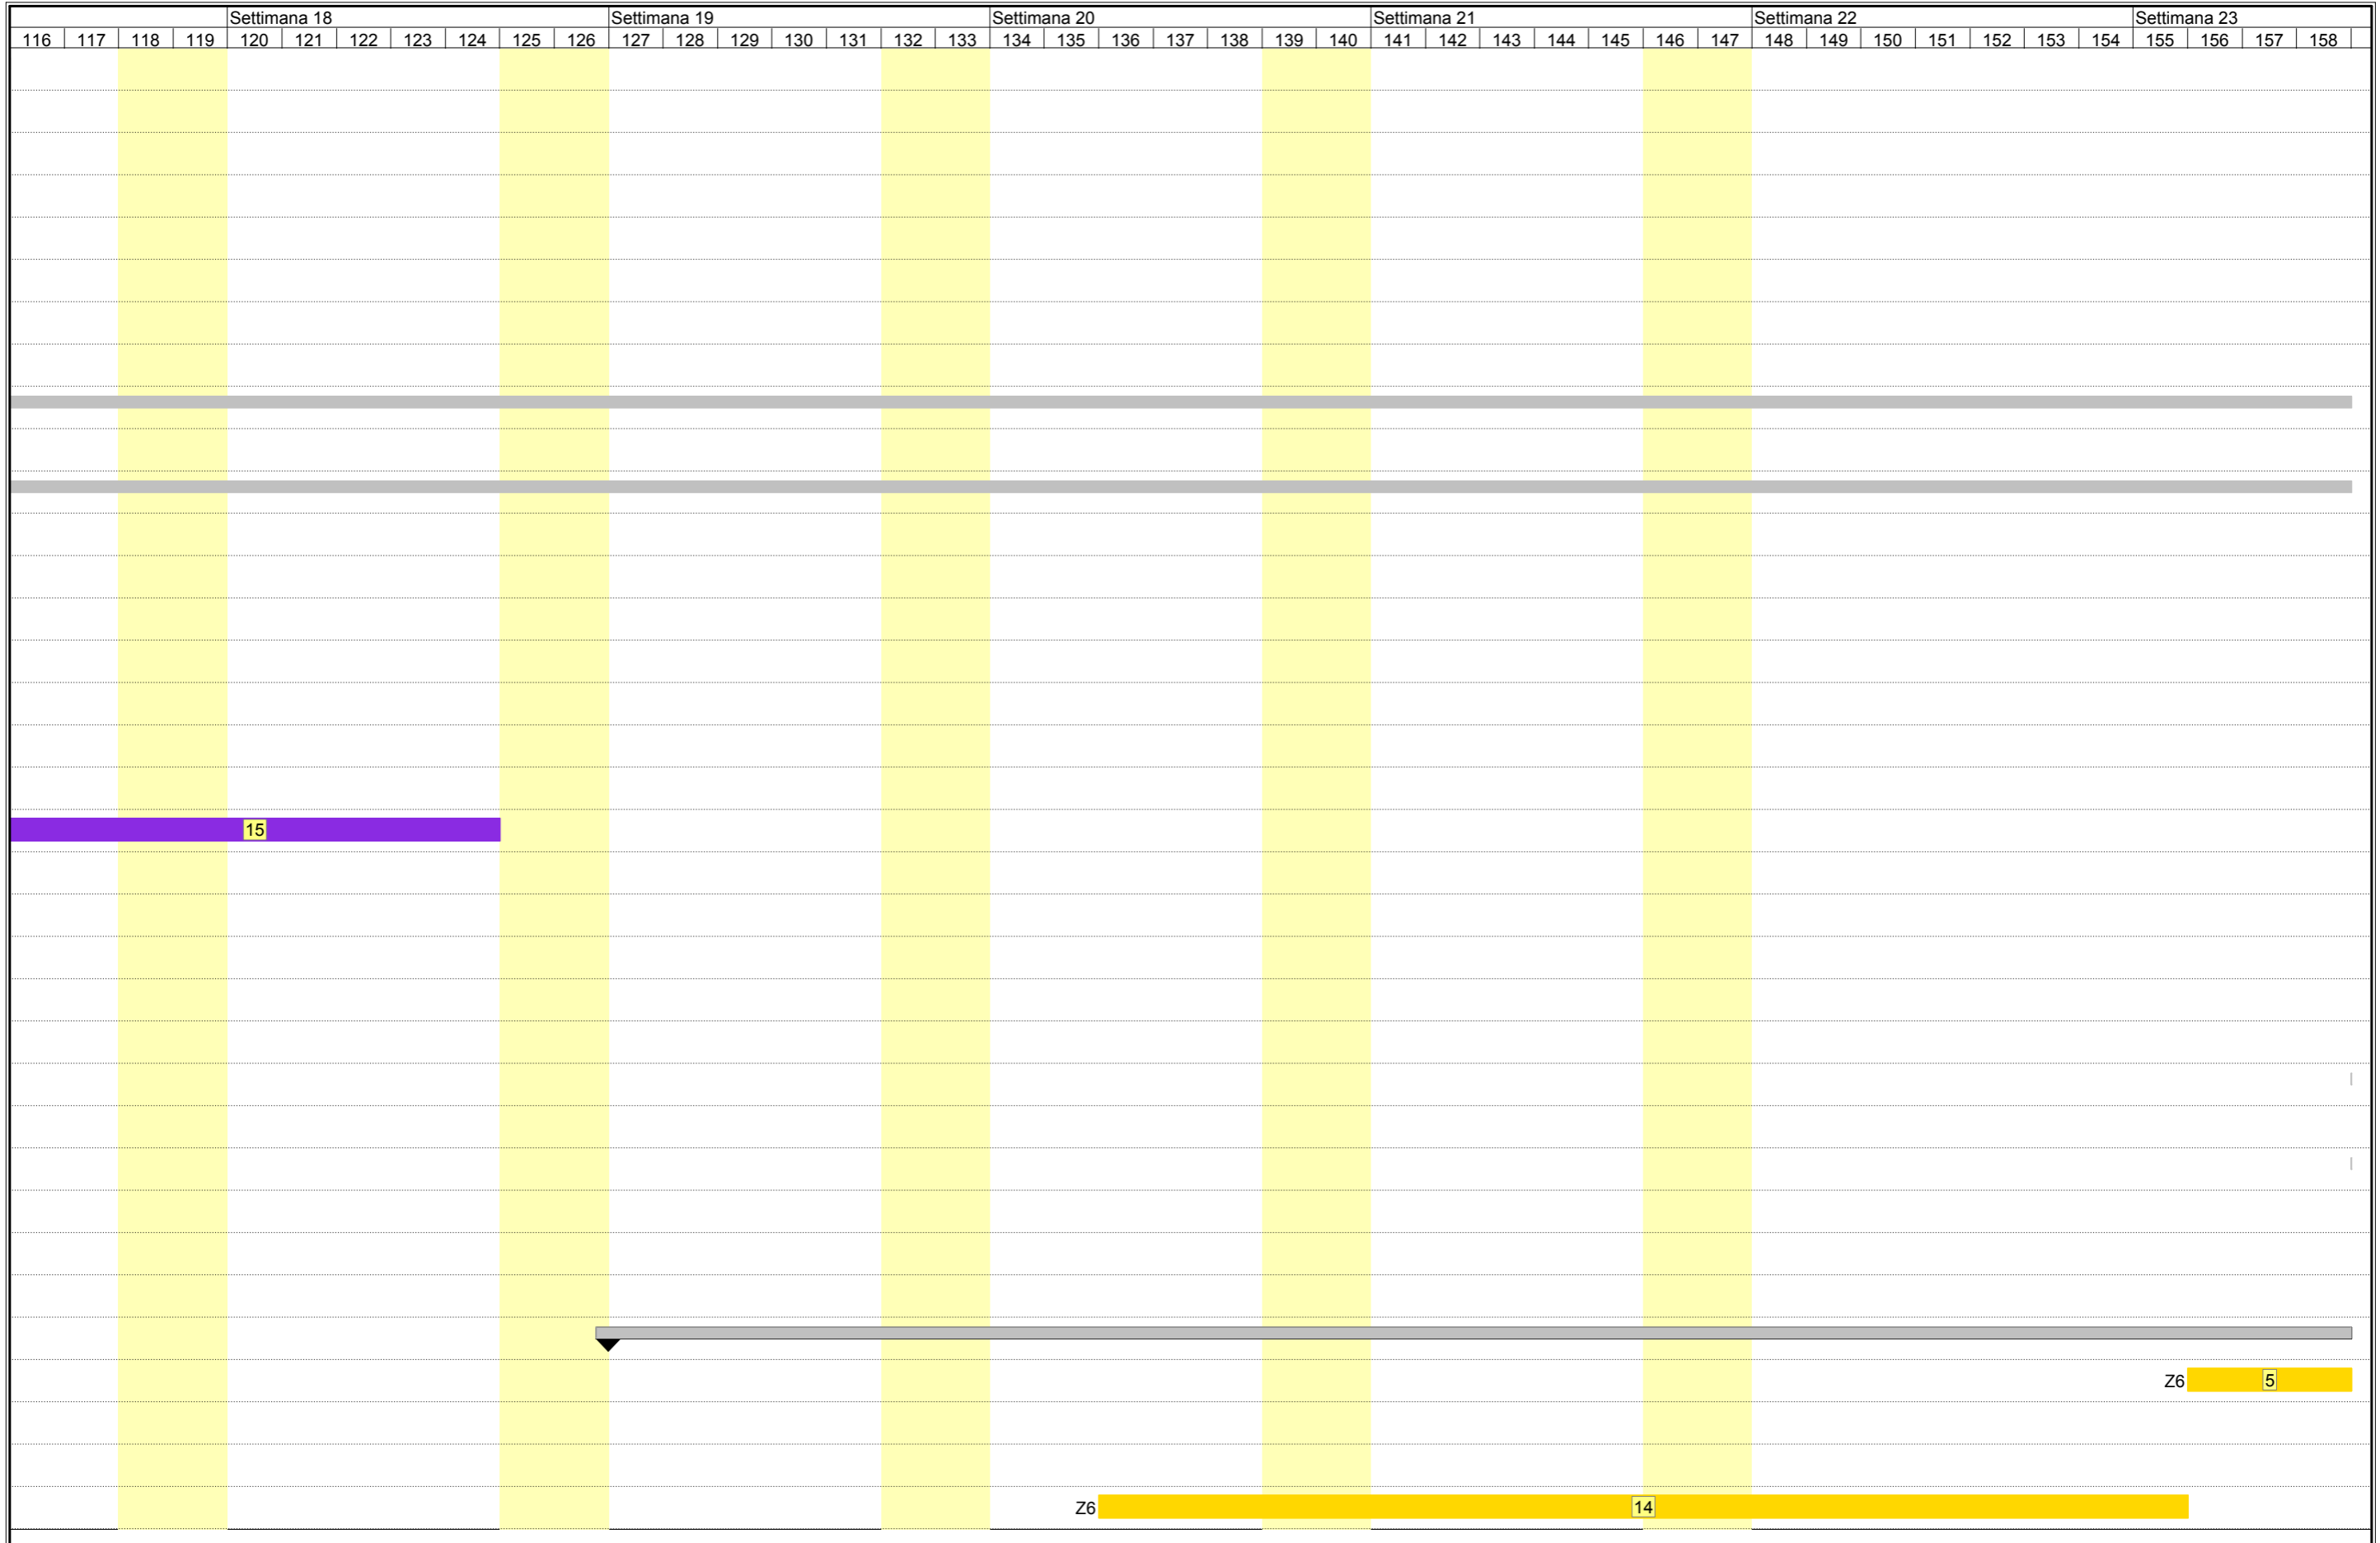

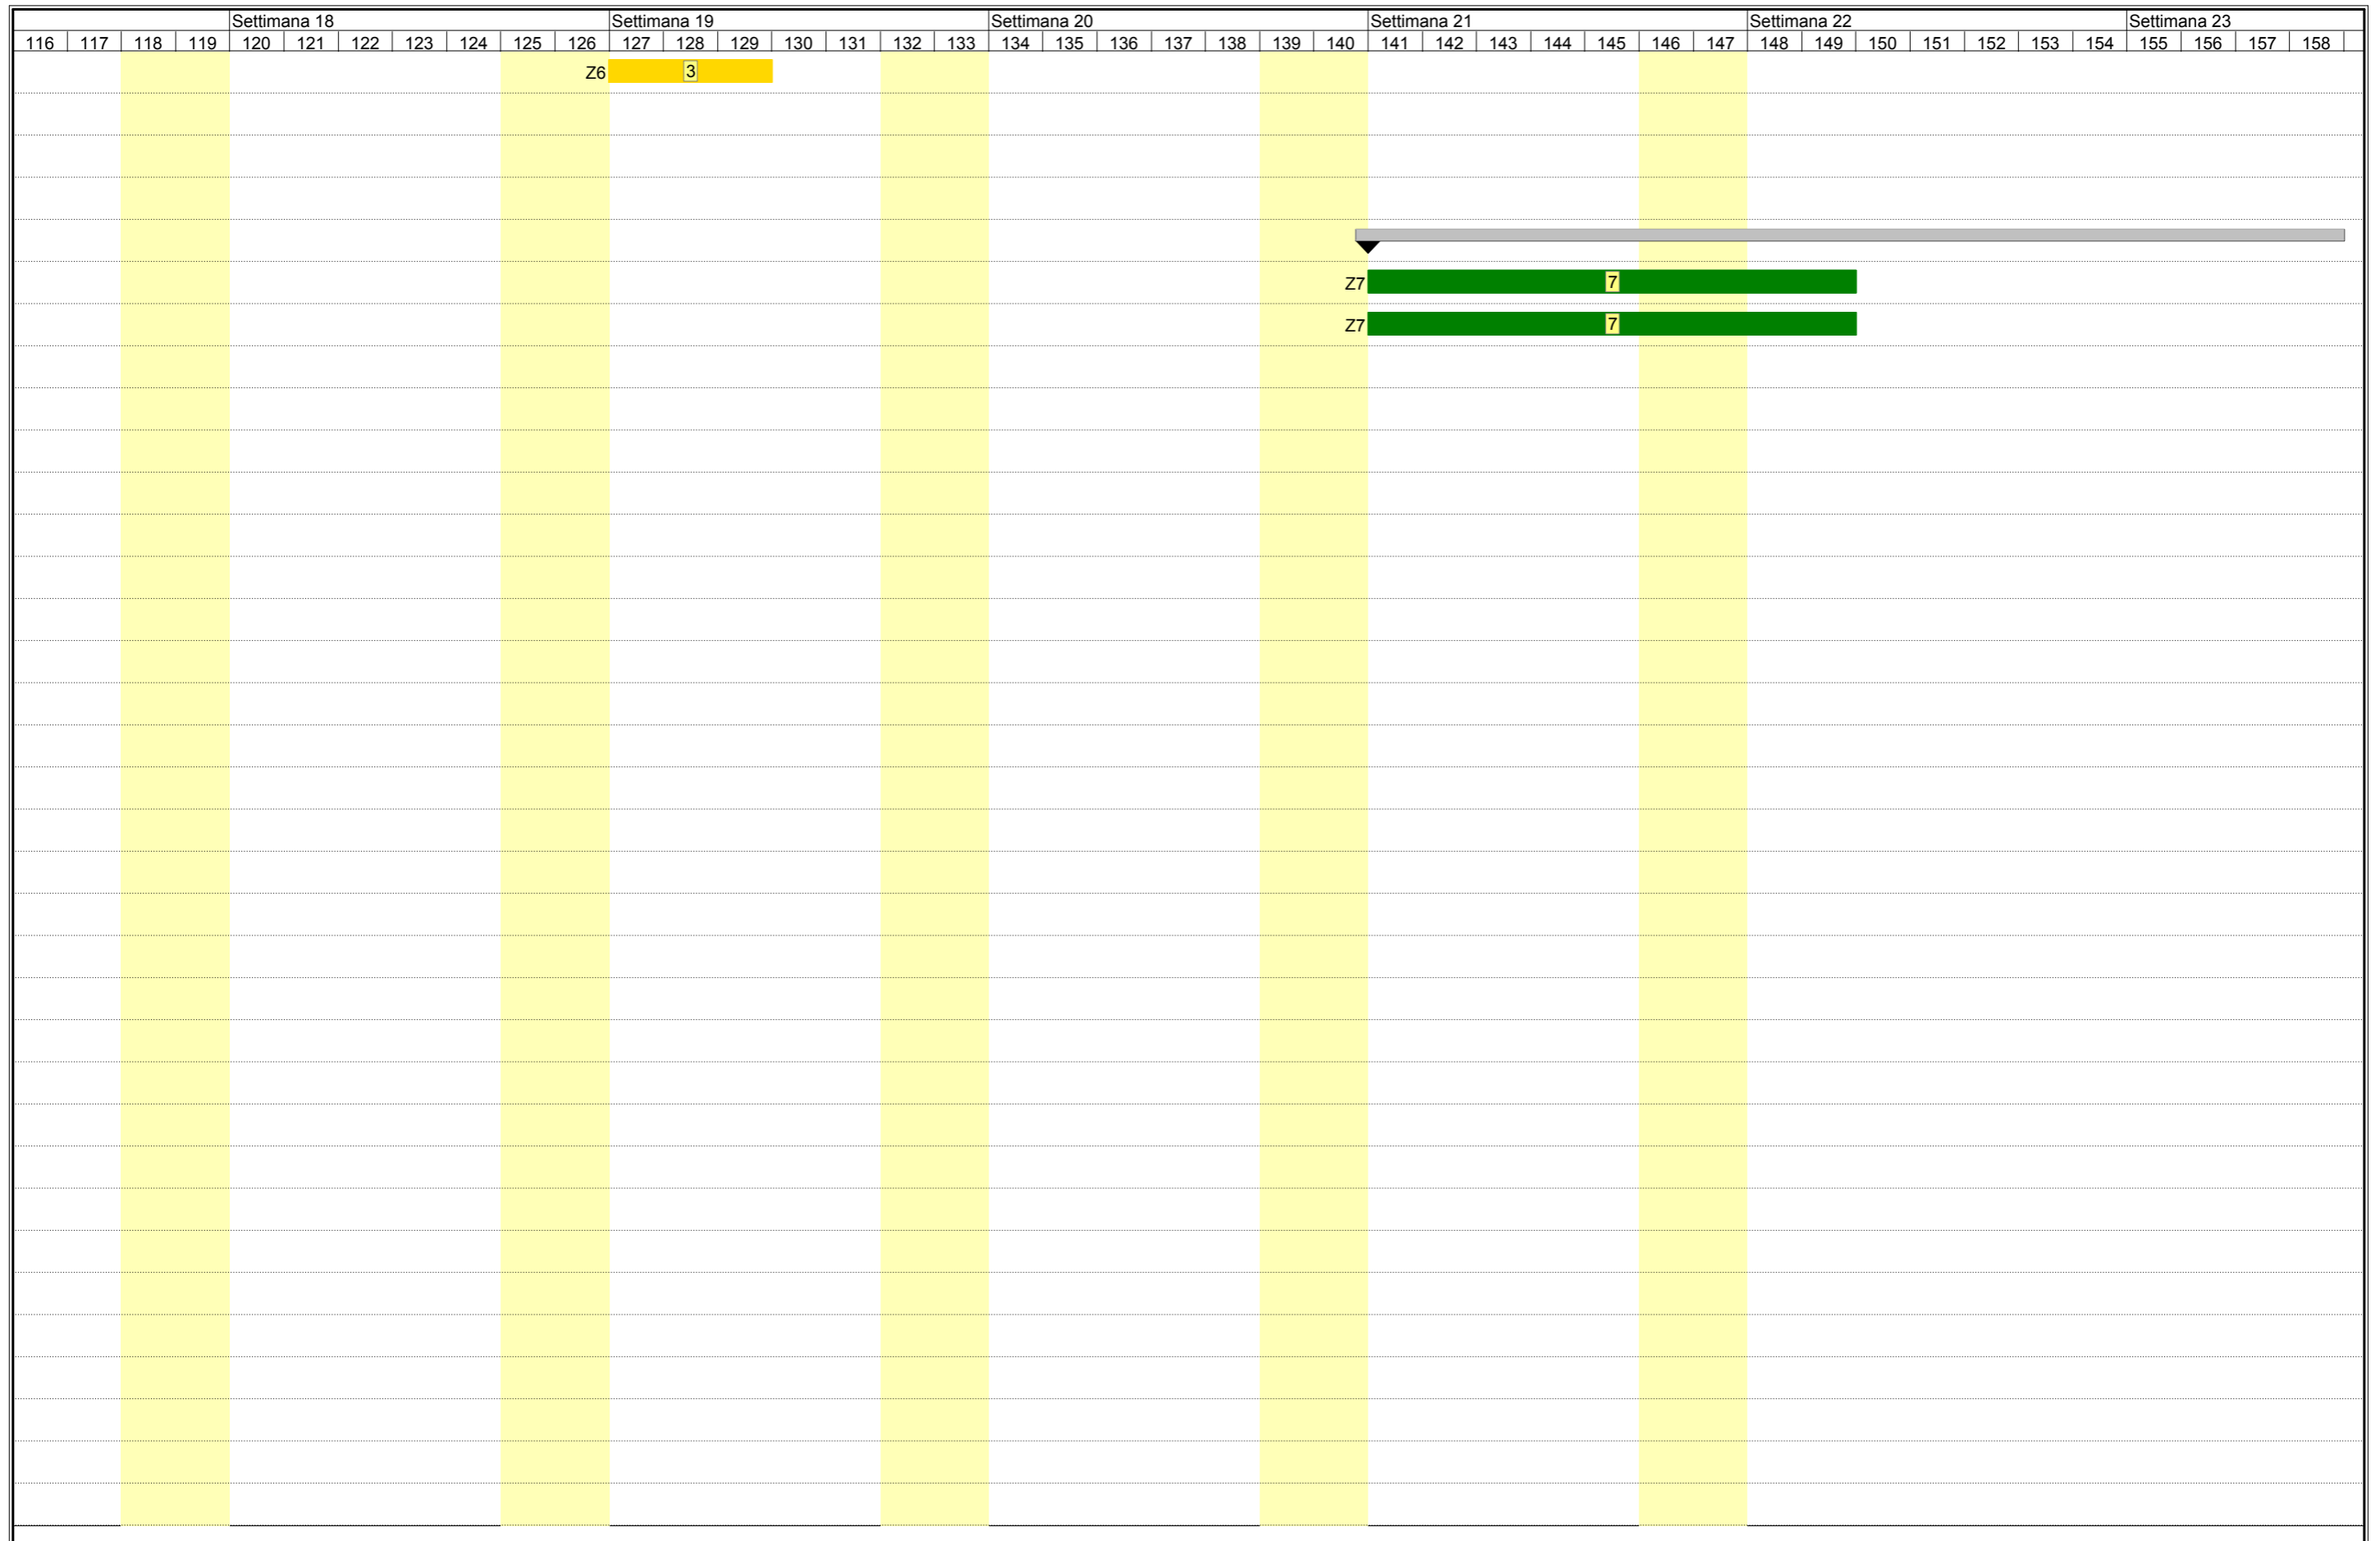


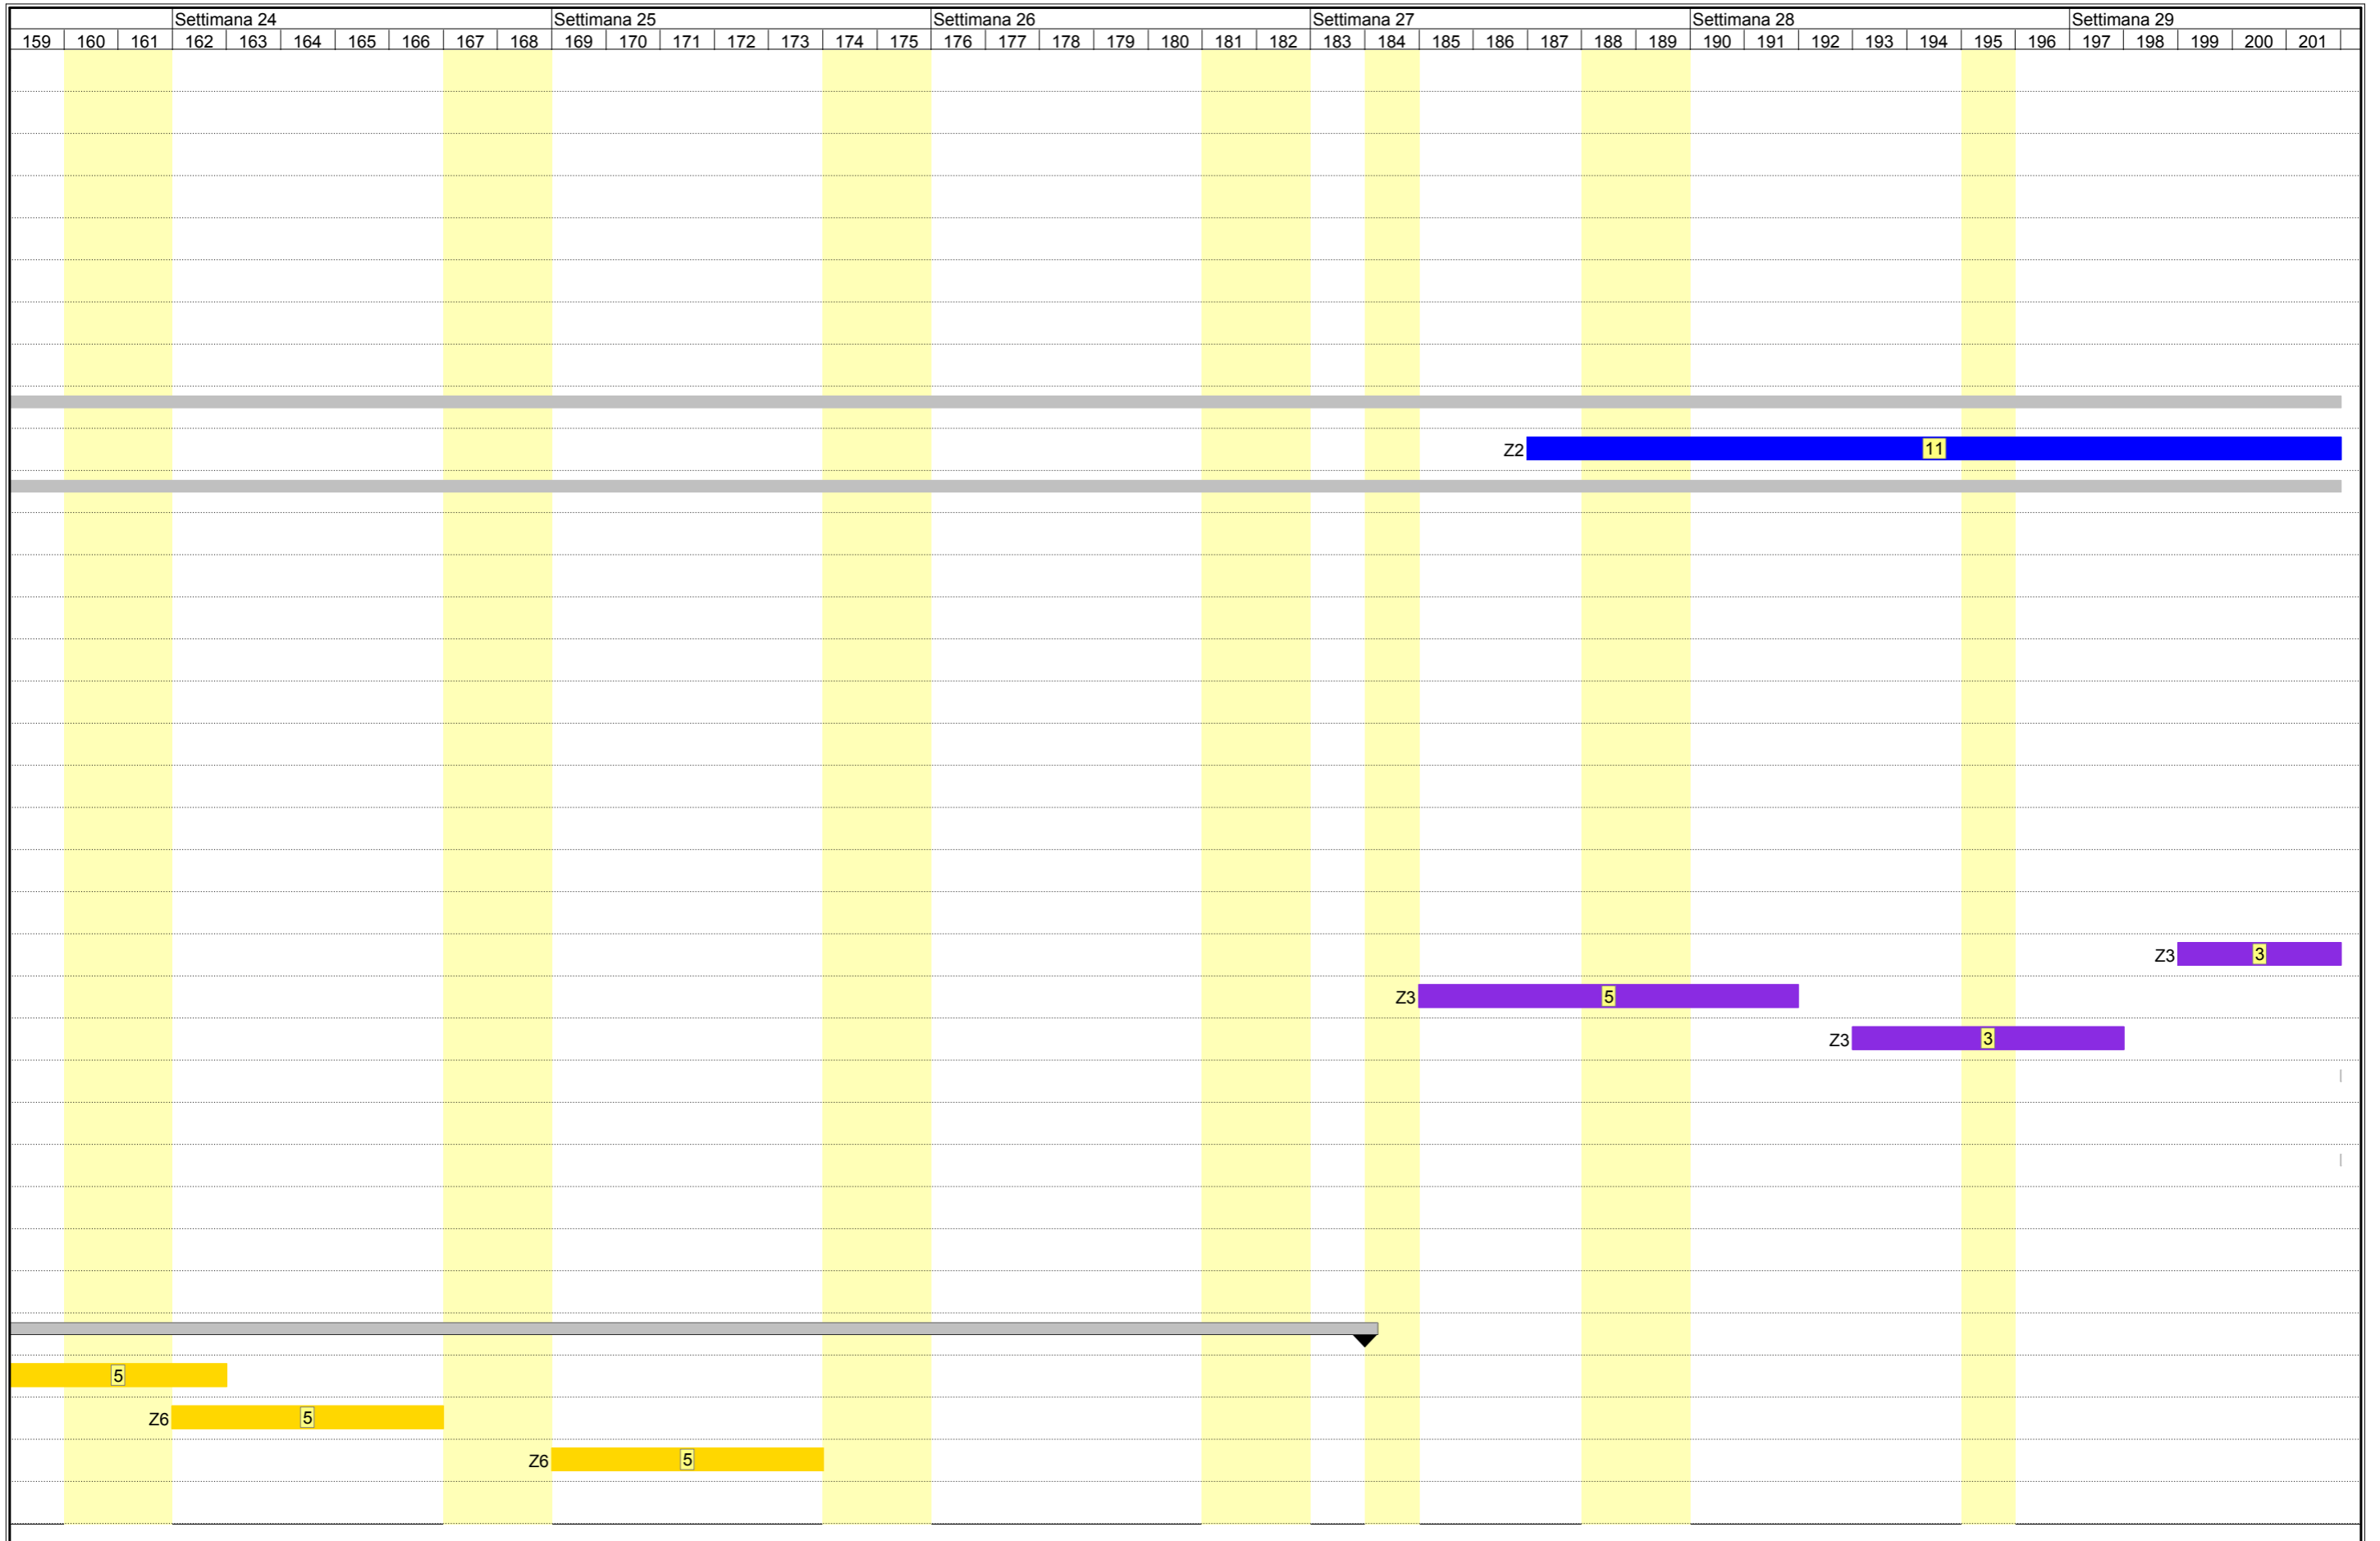

Settimana 24			Settimana 25				Settimana 26					Settimana 27				Settimana 28					Settimana 29																																	
159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201												
																	Z6	1																																				
																	Z6	5																																				
																				Z6	2																																	

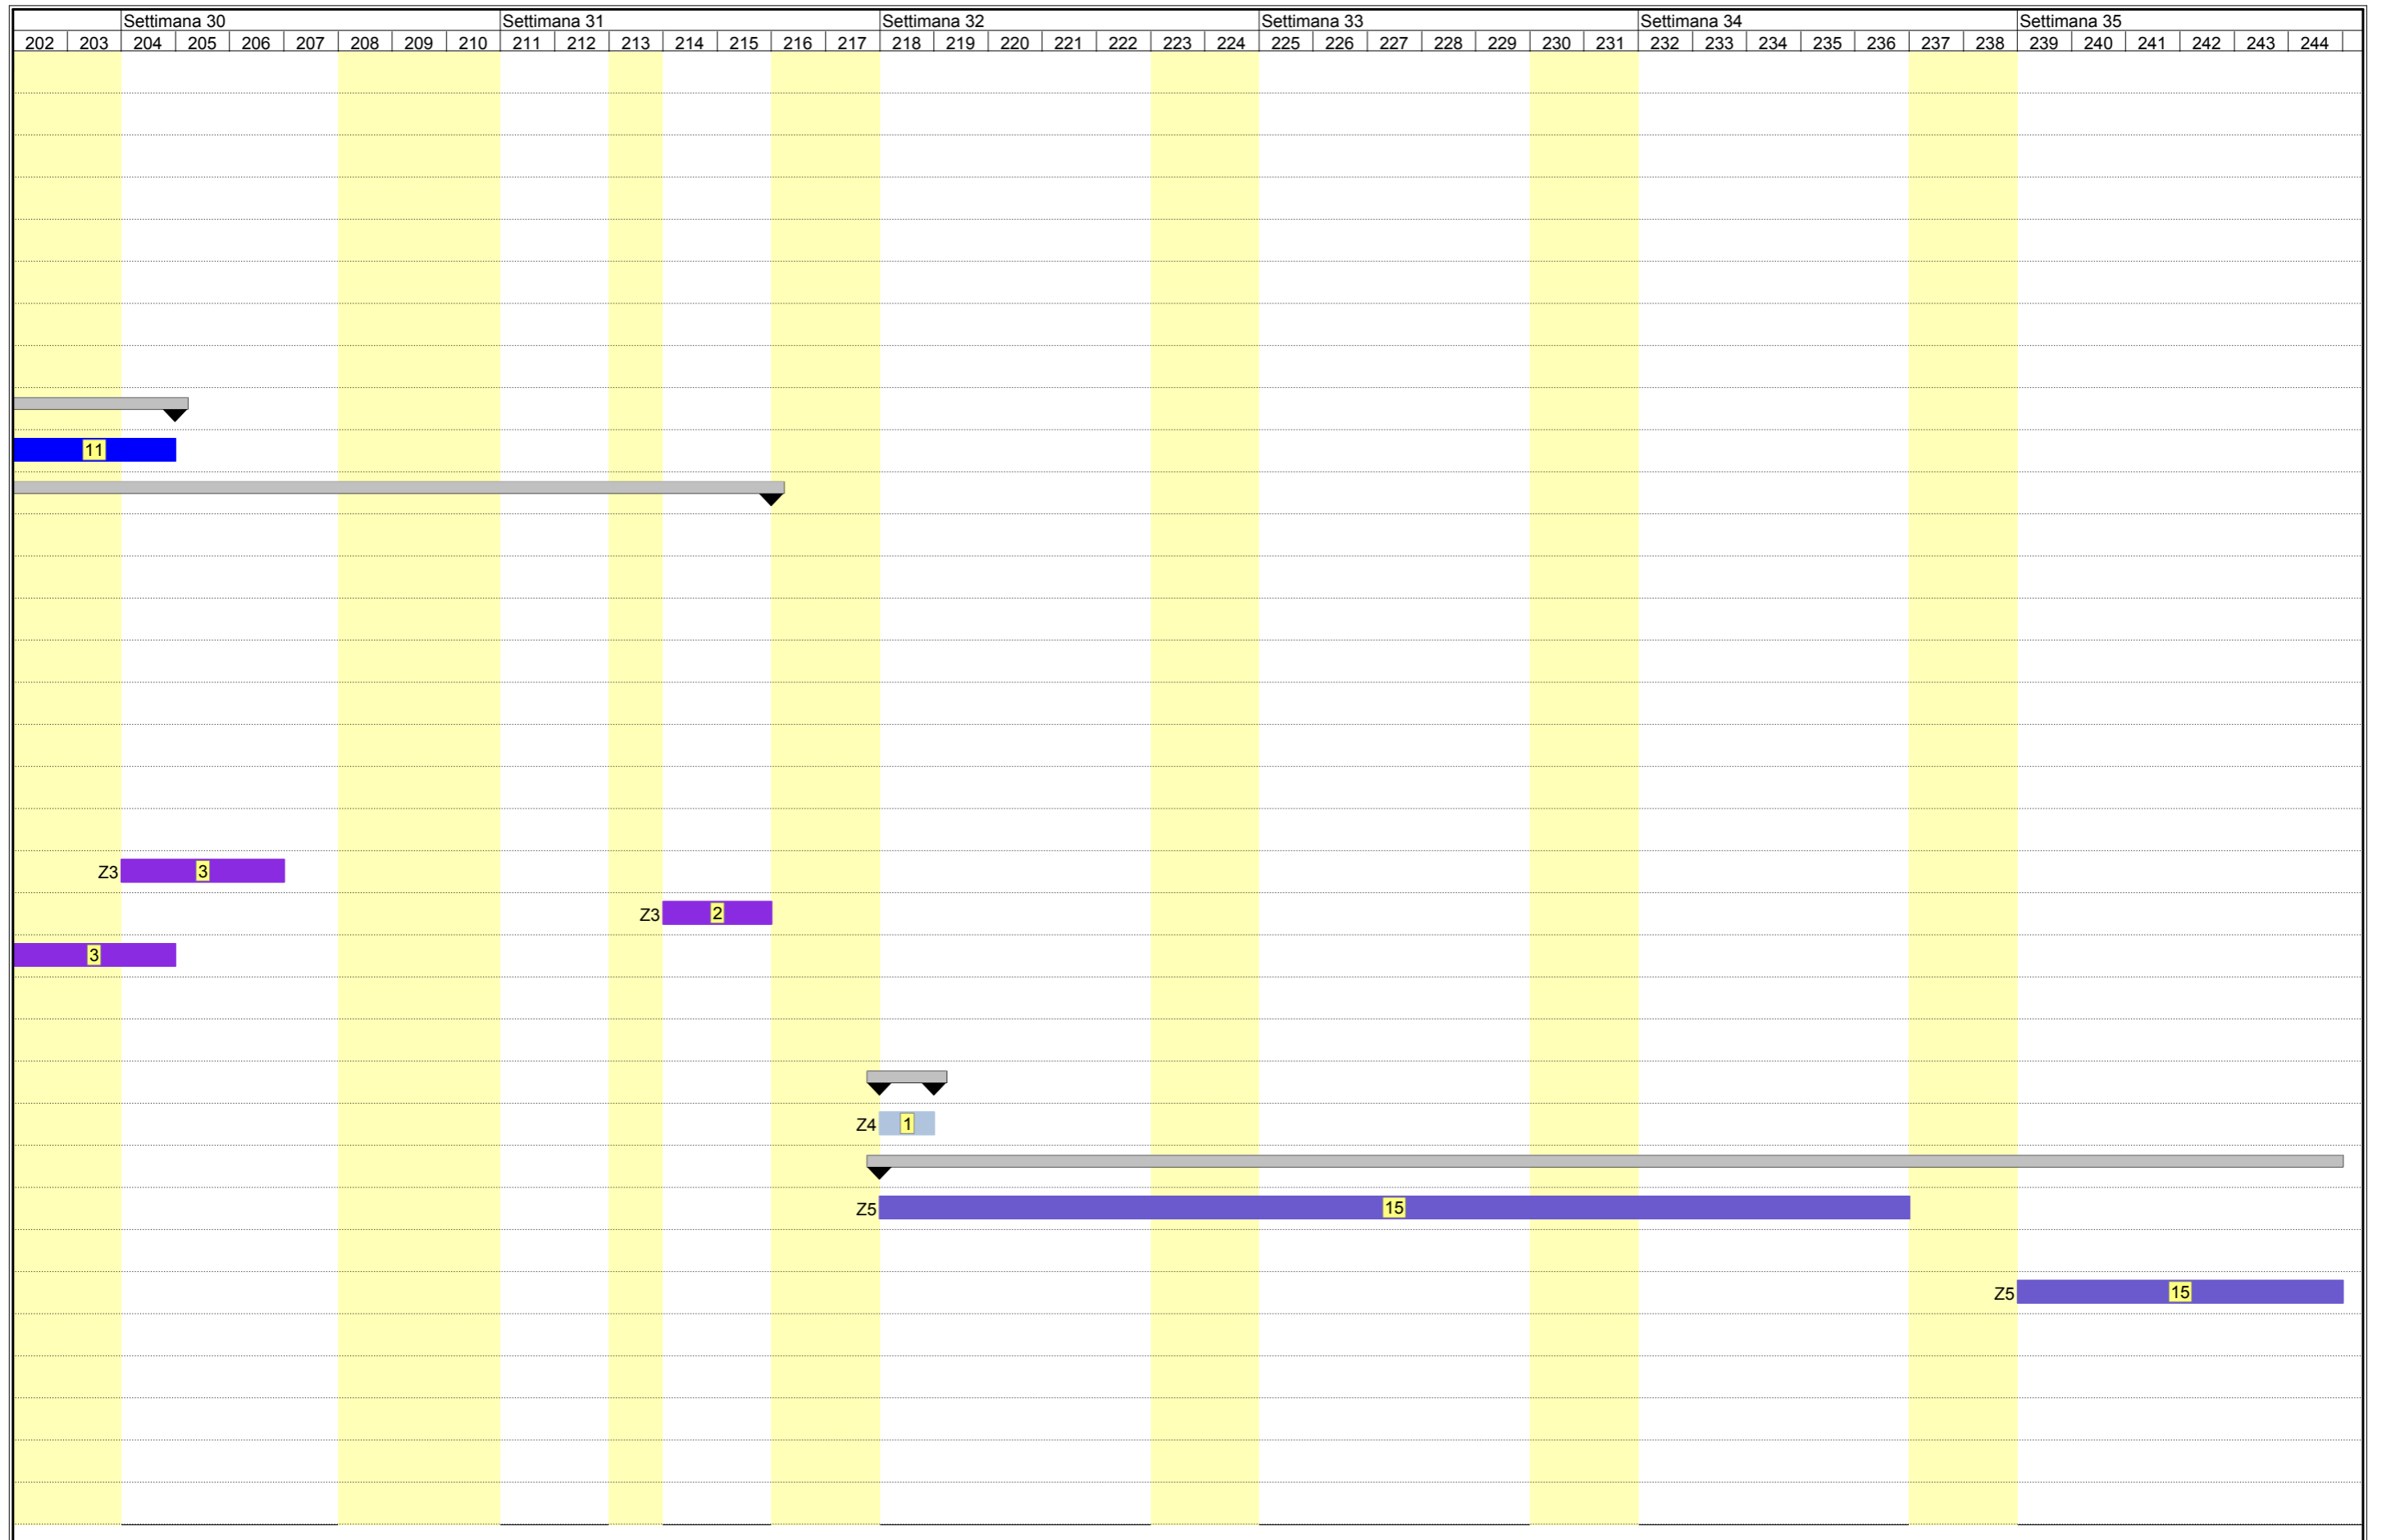

		Settimana 30								Settimana 31						Settimana 32						Settimana 33						Settimana 34						Settimana 35																
202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244								

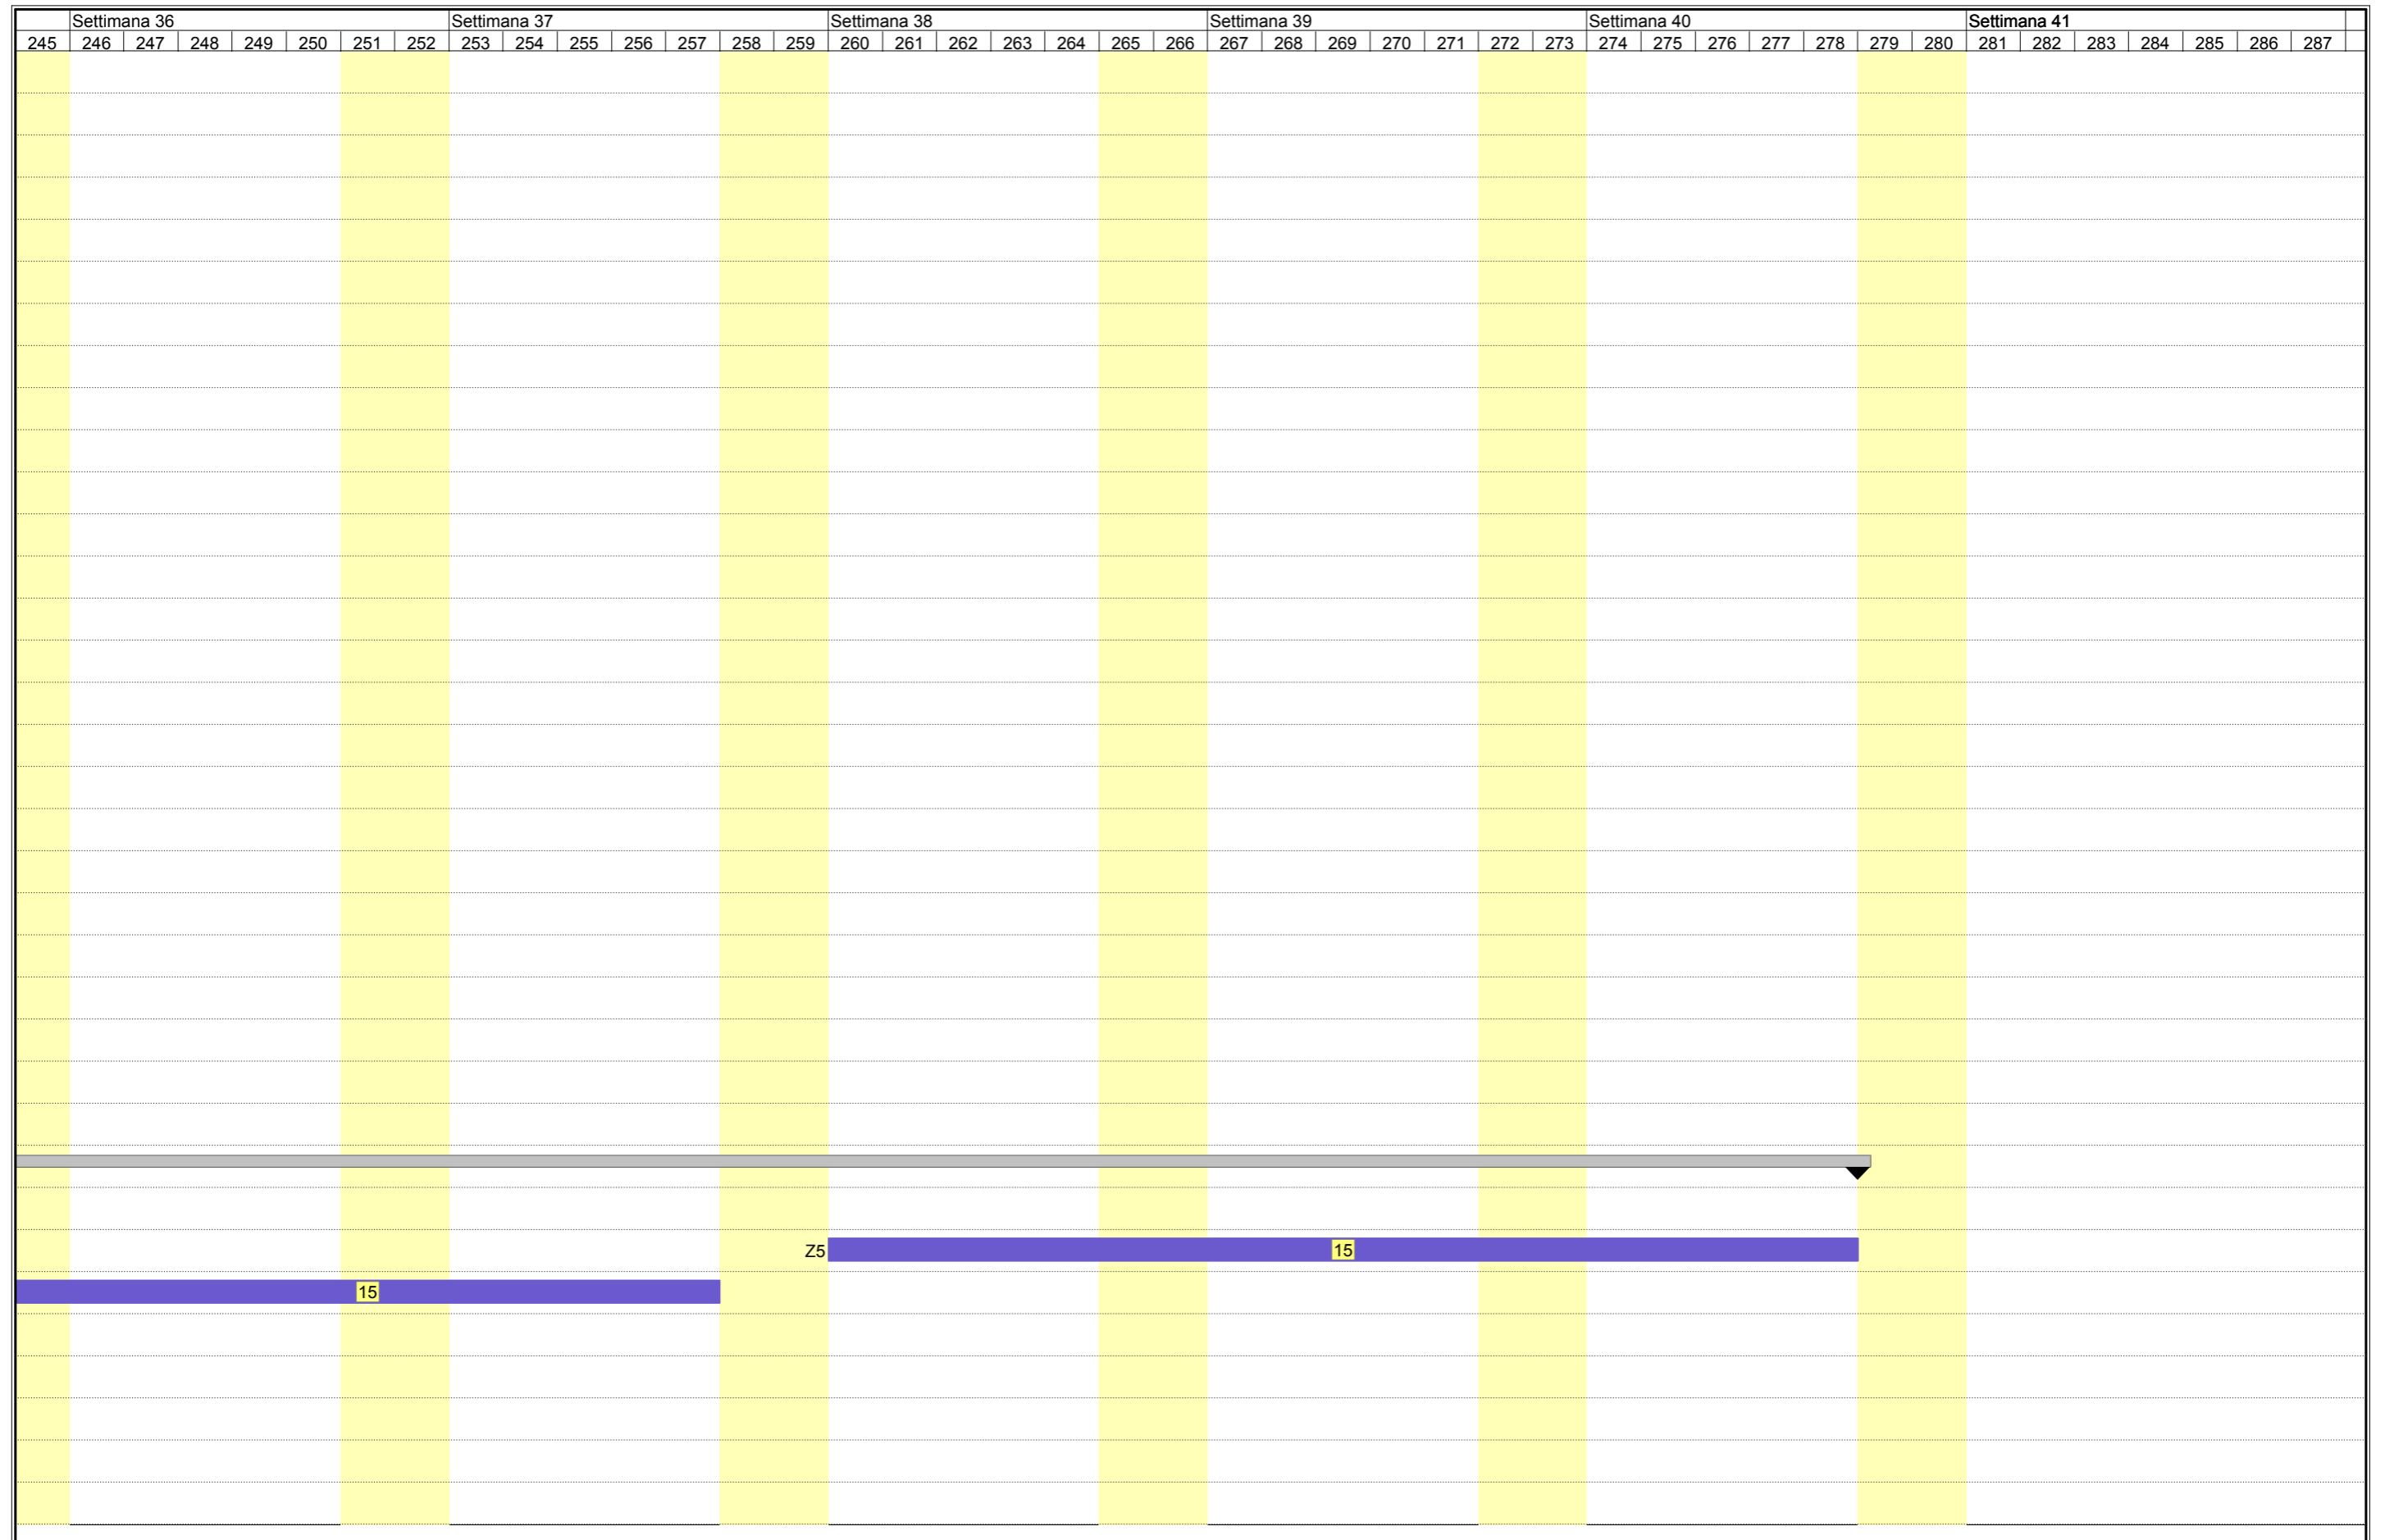

Settimana 42						Settimana 43						Settimana 44						Settimana 45						Settimana 46						Settimana 47						Settim											
288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330					

